RELATÓRIO CONSOLIDADO DOS PLANOS DE ATUAÇÃO

Coordenadorias Regionais I a VII | Biênio 2022/2023

1. Síntese executiva

O levantamento compreende 93 planos de ação distribuídos entre sete Coordenadorias Regionais. A situação de cada plano segue a classificação apresentada no relatório consolidado do Sistema INOVA. Os gráficos de pizza, inseridos junto às respectivas coordenadorias, mostram a composição percentual dos planos concluídos, não concluídos e registrados como feitos sem data informada.

Coordenadoria	Planos	Concluídos	Não concluídos	Sem data
Regional I	17	15	2	0
Regional II	25	13	11	1
Regional III	6	0	6	0
Regional IV	6	4	2	0
Regional V	5	0	5	0
Regional VI	9	0	9	0
Regional VII	25	2	22	1
TOTAL	93	34	57	2


Distribuição geral: 34 concluídos (36,6%), 57 não concluídos (61,3%) e 2 feitos sem data de conclusão (2,2%).

Critério: cada linha representa um plano de ação, não uma atividade interna. “Não concluído” indica a existência de atividades em situação “A Fazer” ou “Fazendo”. “Não informada” corresponde a registro “Feito” sem data de conclusão em uma ou mais atividades; esses registros são apresentados separadamente para evitar classificação indevida.

2. Detalhamento por Coordenadoria Regional

Coordenadoria Regional I

Total de planos de ação: 17 | Concluídos: 15 | Não concluídos: 2 | Feitos sem data: 0

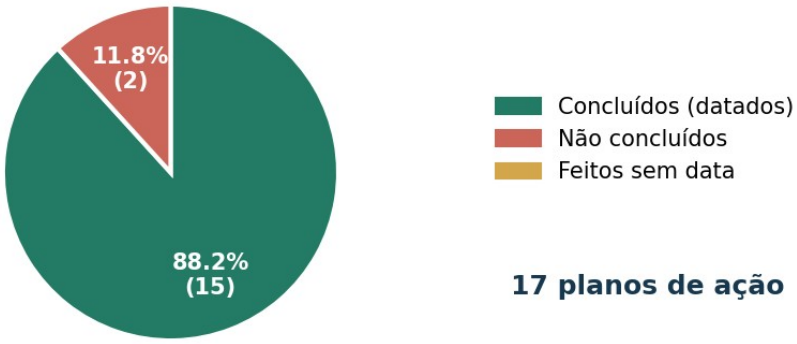


Relação de planos de ação

Plano de ação	Início	Conclusão / situação
1. PLANO DE BACIA DO RIO SÃO MATEUS e ITAUNAS	01/03/2023	20/12/2023
2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MUCURICI	01/03/2023	20/12/2023
3. LEI DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	01/03/2023	30/12/2023
4. PLANO DE BACIA DO RIO ITAUNAS	01/03/2023	06/07/2023
5. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MONTANHA	01/03/2023	Não concluído
6. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PEDRO CANÁRIO	01/03/2023	30/12/2023
7. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PINHEIROS	01/03/2023	30/12/2023
8. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PONTO BELO	01/03/2023	20/12/2023
9. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BOA ESPERANÇA	01/03/2023	30/12/2023
10. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ÁGUA DOCE DO NORTE	01/03/2023	30/12/2023
11. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BARRA DE SÃO FRANCISCO	01/03/2023	30/12/2023
12. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MANTENÓPOLIS	01/03/2023	30/12/2023
13. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ECOPORANGA	01/03/2023	30/12/2023
14. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VILA PAVÃO	01/03/2023	30/12/2023
15. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONCEIÇÃO DA BARRA	01/03/2023	Não concluído
16. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - NOVA VENÉCIA	01/03/2023	30/10/2023
17. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO MATEUS	01/03/2023	30/12/2023

Coordenadoria Regional II

Total de planos de ação: 25 | Concluídos: 13 | Não concluídos: 11 | Feitos sem data: 1

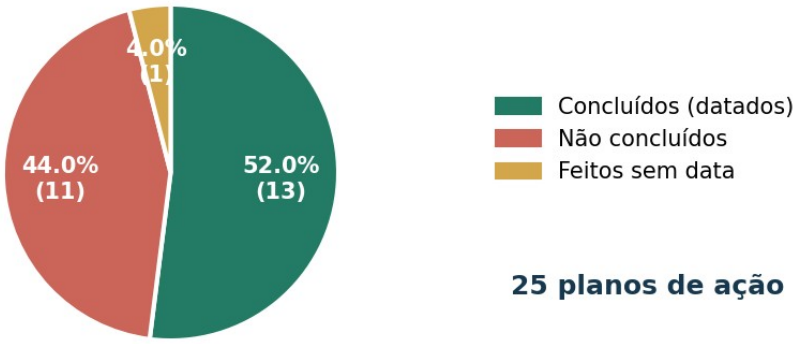


Relação de planos de ação

Plano de ação	Início	Conclusão / situação
1. PLANO DE BACIA DO RIO SANTA JOANA	01/08/2022	30/11/2023
2. PLANO DE BACIA DO RIO SANTA MARIA DO DOCE e RIO STA JOANA	01/08/2022	Não concluído
3. PLANO DE BACIA PONTÕES E LAGOA DO DOCE	01/08/2022	Não concluído
4. PLANO DE BACIA BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE	01/08/2022	Não concluído
5. PLANO DE BACIA DO RIO GUANDU	01/08/2022	Não informada
6. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ALTO RIO NOVO	01/08/2022	27/07/2023
7. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MARILÂNDIA	01/08/2022	25/04/2023
8. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PANCAS	01/08/2022	30/08/2023
9. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RIO BANANAL	01/08/2022	30/03/2023
10. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO DOMINGOS DO NORTE	01/08/2022	09/05/2023
11. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ÁGUIA BRANCA	01/08/2022	Não concluído
12. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO GABRIEL DA PALHA	01/08/2022	05/12/2023
13. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VILA VALÉRIO	01/08/2022	Não concluído
14. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - GOVERNADOR LINDENBERG	01/08/2022	03/08/2023
15. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ITAGUAÇU	01/08/2022	30/08/2023
16. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ITARANA	01/08/2022	Não concluído
17. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COLATINA	01/08/2022	03/08/2023
18. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO ROQUE DO CANAÃ	01/08/2022	Não concluído
19. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - JAGUARÉ	01/08/2022	Não concluído
20. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - LINHARES	01/08/2022	09/10/2023
21. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SOORETAMA	01/08/2022	25/10/2023
22. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIXO GUANDU	01/08/2022	Não concluído

Plano de ação	Início	Conclusão / situação
23. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BREJETUBA	01/08/2022	Não concluído
24. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - LARANJA DA TERRA	01/08/2022	Não concluído
25. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - AFONSO CLÁUDIO	01/08/2022	22/11/2023

Coordenadoria Regional III

Total de planos de ação: 6 | Concluídos: 0 | Não concluídos: 6 | Feitos sem data: 0

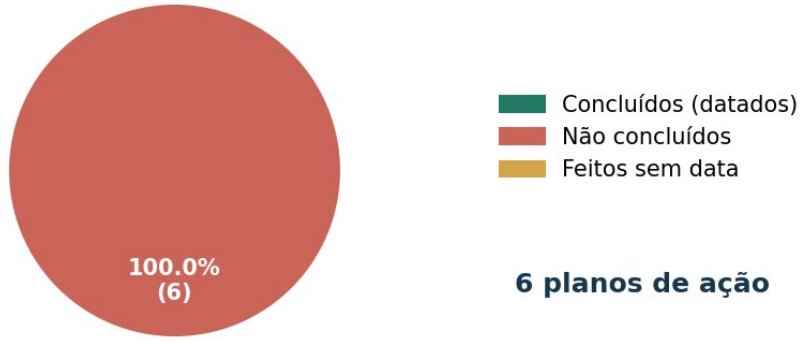


Relação de planos de ação

Plano de ação	Início	Conclusão / situação
1. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUNDÃO	01/03/2023	Não concluído
2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - IBIRAÇU	01/03/2023	Não concluído
3. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - JOÃO NEIVA	01/03/2023	Não concluído
4. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SANTA TERESA	01/03/2023	Não concluído
5. PLANO DE BACIA - RIACHO E REIS MAGOS	01/03/2023	Não concluído
6. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ARACRUZ	01/03/2023	Não concluído

Coordenadoria Regional IV

Total de planos de ação: 6 | Concluídos: 4 | Não concluídos: 2 | Feitos sem data: 0

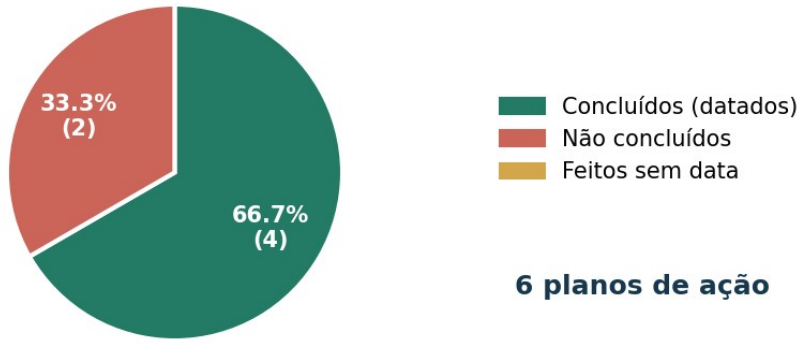


Relação de planos de ação

Plano de ação	Início	Conclusão / situação
1. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CARIACICA	10/01/2023	Não concluído
2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SERRA	10/01/2023	06/12/2023
3. PLANO DE BACIA RIO JUCU	10/01/2023	15/12/2023
4. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DOMINGOS MARTINS	10/01/2023	24/12/2023
5. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VIANA	10/01/2023	24/11/2024
6. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MARECHAL FLORIANO	10/01/2023	Não concluído

Coordenadoria Regional V

Total de planos de ação: 5 | Concluídos: 0 | Não concluídos: 5 | Feitos sem data: 0

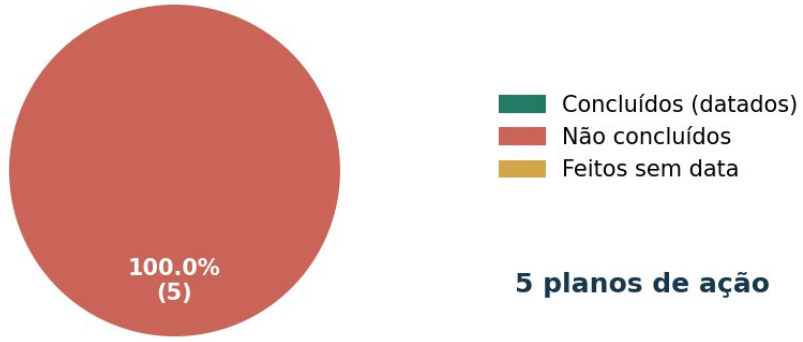


Relação de planos de ação

Plano de ação	Início	Conclusão / situação
1. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SANTA LEOPOLDINA	01/08/2022	Não concluído
2. PLANO DE BACIA DO RIO STA MARIA DA VITÓRIA	01/08/2022	Não concluído
3. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VITÓRIA	01/08/2022	Não concluído
4. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VILA VELHA	01/08/2022	Não concluído
5. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SANTA MARIA DE JETIBÁ	01/08/2022	Não concluído

Coordenadoria Regional VI

Total de planos de ação: 9 | Concluídos: 0 | Não concluídos: 9 | Feitos sem data: 0

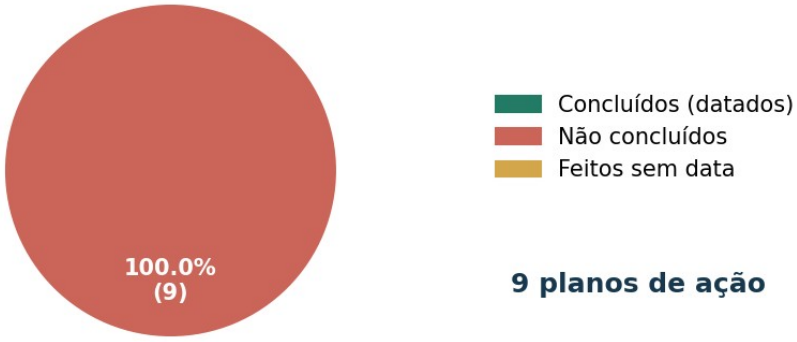


Relação de planos de ação

Plano de ação	Início	Conclusão / situação
1. PLANO DE BACIA DO RIO BENEVENTE E GUARAPARI	01/08/2022	Não concluído
2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ALFREDO CHAVES	01/08/2022	Não concluído
3. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ANCHIETA	01/08/2022	Não concluído
4. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PIÚMA	01/08/2022	Não concluído
5. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - GUARAPARI	01/08/2022	Não concluído
6. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RIO NOVO DO SUL	01/08/2022	Não concluído
7. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ICONHA	01/08/2022	Não concluído
8. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VARGEM ALTA	01/08/2022	Não concluído
9. PLANO DE BACIA DO RIO NOVO	01/08/2022	Não concluído

Coordenadoria Regional VII

Total de planos de ação: 25 | Concluídos: 2 | Não concluídos: 22 | Feitos sem data: 1

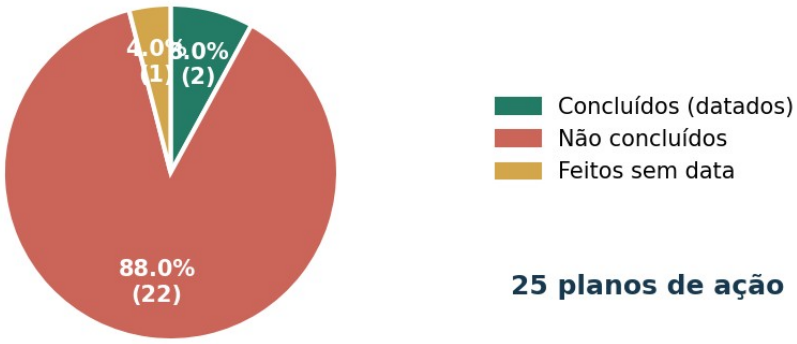

Relação de planos de ação

Plano de ação	Início	Conclusão / situação
1. PLANO DE BACIA DO RIO ITAPEMIRIM	01/08/2023	Não informada
2. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	01/08/2023	02/09/2023
3. PLANO DE BACIA DO RIO ITABAPOANA	01/03/2023	30/10/2023
4. CASTELO	01/03/2023	Não concluído
5. CONCEIÇÃO DO CASTELO	01/08/2023	Não concluído
6. IBITIRAMA	01/03/2023	Não concluído
7. IRUPI	01/08/2023	Não concluído
8. JERÔNIMO MONTEIRO	01/08/2023	Não concluído
9. MUNIZ FREIRE	01/08/2023	Não concluído
10. VENDA NOVA DO IMIGRANTE	01/08/2023	Não concluído
11. IBATIBA	01/08/2023	Não concluído
12. IUNA	01/08/2023	Não concluído
13. MARATAÍZES	01/08/2023	Não concluído
14. DIVINO SÃO LOURENÇO	01/08/2023	Não concluído
15. MUQUI	01/08/2023	Não concluído
16. ALEGRE	01/08/2023	Não concluído
17. ITAPEMIRIM	01/08/2023	Não concluído
18. ATÍLIO VIVACQUA	01/08/2023	Não concluído
19. GUAÇUI	01/03/2023	Não concluído
20. SÃO JOSÉ DO CALÇADO	01/08/2023	Não concluído
21. BOM JESUS DO NORTE	01/08/2023	Não concluído
22. APIACA	01/08/2023	Não concluído
23. MIMISO DO SUL	01/08/2023	Não concluído
24. DORES DO RIO PRETO	01/08/2023	Não concluído
25. PRESIDENT KENNEDY	01/08/2023	Não concluído

Ministério Público do Espírito Santo

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

COORDENADORIA REGIONAL I - BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS ITAUNAS E SÃO MATEUS

Tipo: Projeto
Status: Finalizado
Tags:

Área Regional:
Unidade:

::: Objetivo

Atuar em colaboração junto aos entes da política da bacia (à nível estadual, municipal e com os respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH) na troca de informações, no planejamento e no acompanhamento das obras / serviços executados afim de: • assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos; • a utilização racional e integrada dos recursos hídricos; • a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. METAS Faz parte das metas deste Plano de Atuação o atingimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 06, 12, 14 e 13 para 2030 de acordo com o pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015, pelos 193 países membros. ODS 6 – Água potável e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. ODS 12 – Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. ODS 14 – Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.

::: Equipe de Trabalho

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
CELINA RAQUEL VICENTE DE SOUZA
Convidado
(27) 3333-3333

Promotoria de Justiça de Nova Venécia
IANNA PAULA BESSA SAMPAIO GUIMARÃES
Integrante do projeto
(27) 3333-3333

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
LEILA LEÃO LACERDA
Convidado
(27) 3194-5000

Promotoria de Justiça de Nova Venécia
LÉLIO MARCARINI
Responsável pelo projeto
(27) 3333-3333



Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
MARCOS JOSÉ MARSAIOLI
Gerente do Projeto
(27) 3194-5000

::: Plano de Ações

1. PLANO DE BACIA DO RIO SÃO MATEUS e ITAUNAS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

1.1. 1. Formulário Forms - Diagnóstico CBH

Enviar para o CBH, por meio de Ofício, um questionário (formulário Forms) para que o CBH preencha em reunião conjunta. Os questionamentos não caracterizam uma fiscalização, apenas um diagnóstico com a finalidade de se buscar melhores condições para os trabalhos do comitê

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 31/08/2023
- **Conclusão:** 20/06/2023

1.2. 2. Reunião de alinhamento com o CBH Rio São Mateus

Realizar reunião inicial de alinhamento com o Comitê de Bacia Hidrográfica e o técnico da AGERH responsável pelo CBH Pauta sugerida: 1. Apresentação da nova forma atuação MPES 2. Análise das respostas obtidas no Formulário forms 3. Sugerir a elaboração de Plano Trabalho para 2023 baseado no Plano de bacia (MOP) 4. Envio da ata das reuniões do CBH ao Coordenador para acompanhamento das atividades do CBH

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 08/03/2022

1.3. 3. Requisitar ao CBH rio São Mateus Plano de Trabalho

Apresentar para o Coordenador Regional do Plano de Trabalho elaborado pelo CBH para ser implementado no ano de 2023

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/11/2023
- **Conclusão:** 30/05/2023

1.4. 4. Plano de Trabalho CBH Rio São Mateus

Apresentação do Plano de Trabalho para ser implementado no ano de 2023

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 20/12/2023

2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MUCURICI

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

2.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 20/02/2023

2.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

2.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 20/12/2023

2.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no munucípio.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 20/12/2023

3. LEI DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

3.1. 1. Notificar o Órgão Gestor Estadual (SEDU e SEAMA)

Notificar o Órgão Gestor Estadual (SEDU e SEAMA), responsáveis técnicos, a citar as ações que estão sendo realizadas em prol do enraizamento da Educação Ambiental Municipal

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/03/2023
- **Conclusão:** 01/04/2023

3.2. 2. Solicitar a SEDU e IEMA (Gerencia de Educação Ambiental) que promova Oficinas de diagnóstico part

Solicitar a SEDU e IEMA (Gerencia de Educação Ambiental) que promova Oficinas de diagnóstico participativo para a Formação de Gestores em Educação Ambiental afim de que elaborem as Políticas Públicas Municipais de Ed. Ambiental

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/03/2023
- **Conclusão:** 01/04/2023

3.3. 3. Realização da Oficina para a Formação de Gestores

Realização da Oficina para a Formação de Gestores em Educação Ambiental

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/03/2023
- **Conclusão:** 01/04/2023

3.4. 4. Reunião junto aos Promotores de Justiça Naturais e Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Educ

Reunião junto aos Promotores de Justiça Naturais e Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Educação para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a publicação da Lei e do programa de Educação Ambiental nos municípios da bacia

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/03/2023
- **Conclusão:** 01/04/2023

3.5. 5. Firmar um Termo de Compromisso Ambiental

Firmar um Termo de Compromisso Ambiental junto ao Município para a publicação da Lei e do programa de Educação Ambiental

- **Responsável:** Lélio Marcarini

- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

3.6. 6. Acompanhamento dos trabalhos das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Educação

Acompanhamento dos trabalhos das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Educação (reuniões periódicas) para sanar possíveis gargalos

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 05/12/2023

4. PLANO DE BACIA DO RIO ITAUNAS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

4.1. 1. Formulário Forms - Diagnóstico CBH

Enviar para o CBH, por meio de Ofício, um questionário (formulário Forms) para que o CBH preencha em reunião conjunta. Os questionamentos não caracterizam uma fiscalização, apenas um diagnóstico com a finalidade de se buscar melhores condições para os trabalhos do comitê

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 31/08/2023
- **Conclusão:** 06/07/2023

4.2. 2. Reunião de alinhamento com o CBH Rio Itaunas

Realizar reunião inicial de alinhamento com o Comitê de Bacia Hidrográfica e o técnico da AGERH responsável pelo CBH Pauta sugerida: 1. Apresentação da nova forma atuação MPES 2. Análise das respostas obtidas no Formulário forms 3. Sugerir a elaboração de Plano Trabalho para 2023 baseado no Plano de bacia (MOP) 4. Envio da ata das reuniões do CBH ao Coordenador para acompanhamento das atividades do CBH

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 30/04/2023

4.3. 3. Requisitar ao CBH rio Itaunas Plano de Trabalho

Apresentar para o Coordenador Regional do Plano de Trabalho elaborado pelo CBH para ser implementado no ano de 2023

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito

- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/11/2023
- **Conclusão:** 30/05/2023

4.4. 5. Plano de Trabalho CBH Rio Itaunas

Apresentação do Plano de Trabalho para ser implementado no ano de 2023

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 29/06/2023

5. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MONTANHA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

5.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 20/02/2023

5.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

5.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

5.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no munucípio.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

6. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PEDRO CANÁRIO

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

6.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 20/02/2023

6.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

6.3. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no munucípio.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

6.4. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

7. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PINHEIROS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

7.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 20/02/2023

7.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

7.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

7.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no munucípio.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023

- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

8. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PONTO BELO

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

8.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 20/02/2023

8.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

8.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 20/12/2023

8.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no munucípio.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 20/12/2023

9. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BOA ESPERANÇA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

9.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 20/02/2023

9.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

9.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

9.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no munucípio.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

10. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ÁGUA DOCE DO NORTE

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

10.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 20/02/2023

10.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

10.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

10.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no munucípio.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

11. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BARRA DE SÃO FRANCISCO

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

11.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 20/02/2023

11.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

11.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

11.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no munucípio.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

12. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MANTENÓPOLIS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

12.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023

- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 20/02/2023

12.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

12.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

12.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no munucípio.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

13. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ECOPORANGA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

13.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 20/02/2023

13.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

13.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

13.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no munucípio.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

14. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VILA PAVÃO

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

14.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 20/02/2023

14.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito

- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

14.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

14.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no munucípio.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

15. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONCEIÇÃO DA BARRA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

15.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 20/02/2023

15.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

15.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

15.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no munucípio.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

16. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - NOVA VENÉCIA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

16.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 20/02/2023

16.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

16.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem

como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/10/2023

16.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no munucípio.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/10/2023

17. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO MATEUS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

17.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 20/02/2023

17.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

17.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Lélio Marcarini

- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

17.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no munucípio.

- **Responsável:** Lélio Marcarini
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/12/2023

::: Indicadores

Não possui indicadores cadastrados.

Ministério Público do Espírito Santo

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

COORDENADORIA REGIONAL II - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE

Tipo: Projeto
Status: Finalizado
Tags:

Área Regional:
Unidade:

::: Objetivo

Atuar em colaboração junto aos entes da política da bacia (à nível estadual, municipal e com os respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH) na troca de informações, no planejamento e no acompanhamento das obras / serviços executados afim de: • assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos; • a utilização racional e integrada dos recursos hídricos; • a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. METAS Faz parte das metas deste Plano de Atuação o atingimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 06, 12, 14 e 13 para 2030 de acordo com o pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015, pelos 193 países membros. ODS 6 – Água potável e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. ODS 12 – Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. ODS 14 – Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.

::: Equipe de Trabalho

Promotoria de Justiça Cível de Colatina
BRUNA LEGORA DE PAULA
Responsável pelo projeto
(27) 3194-5000

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
JAQUELINE KNAAK
Convidado
(27) 3333-3333

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
LEILA LEÃO LACERDA
Convidado
(27) 3194-5000



Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
MARCOS JOSÉ MARSAIOLI
Gerente do Projeto
(27) 3194-5000

::: Plano de Ações

1. PLANO DE BACIA DO RIO SANTA JOANA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

1.1. Incorporação junto a bacia Sta maria do Doce

.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/11/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

2. PLANO DE BACIA DO RIO SANTA MARIA DO DOCE e RIO STA JOANA

A situação dessa fase é "Fazendo". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

2.1. 1. Formulário Forms - Diagnóstico CBH

Enviar para o CBH, por meio de Ofício, um questionário (formulário Forms) para que o CBH preencha em reunião conjunta. Os questionamentos não caracterizam uma fiscalização, apenas um diagnóstico com a finalidade de se buscar melhores condições para os trabalhos do comitê

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 06/07/2023
- **Conclusão:** 07/12/2022

2.2. 2. Reunião de alinhamento com o CBH

Realizar reunião inicial de alinhamento com o Comitê de Bacia Hidrográfica e o técnico da AGERH responsável pelo CBH

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 06/07/2023
- **Conclusão:** 29/05/2023

2.3. 3. Requisitar ao CBH Plano de Trabalho

Requisitar para o CBH a apresentação do Plano de Trabalho a ser implementado no ano de 2023 baseado no Plano de Bacia e Manual Operativo

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

2.4. 4. Plano de Trabalho CBH Santa Maria do Doce

Apresentação do Plano de Trabalho para ser implementado no ano de 2023

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 20/02/2024
- **Conclusão:**

3. PLANO DE BACIA PONTÕES E LAGOA DO DOCE

A situação dessa fase é "Fazendo". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

3.1. 1. Formulário Forms - Diagnóstico CBH

Enviar para o CBH, por meio de Ofício, um questionário (formulário Forms) para que o CBH preencha em reunião conjunta. Os questionamentos não caracterizam uma fiscalização, apenas um diagnóstico com a finalidade de se buscar melhores condições para os trabalhos do comitê

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 20/11/2022
- **Conclusão:** 07/12/2022

3.2. 2. Reunião de alinhamento com o CBH

Realizar reunião inicial de alinhamento com o Comitê de Bacia Hidrográfica e o técnico da AGERH responsável pelo CBH

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 06/07/2023
- **Conclusão:** 30/08/2023

3.3. 3. Requisitar ao CBH Plano de Trabalho

Requisitar para o CBH a apresentação do Plano de Trabalho a ser implementado no ano de 2023 baseado no Plano de Bacia e Manual Operativo

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

3.4. 4. Plano de Trabalho CBH Pontões e Lagoa do Doce

Apresentação do Plano de Trabalho para ser implementado no ano de 2023

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 01/08/2022

- **Prev Fim:** 20/02/2024
- **Conclusão:**

4. PLANO DE BACIA BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE

A situação dessa fase é "Fazendo". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

4.1. 1. Formulário Forms - Diagnóstico CBH

Enviar para o CBH, por meio de Ofício, um questionário (formulário Forms) para que o CBH preencha em reunião conjunta. Os questionamentos não caracterizam uma fiscalização, apenas um diagnóstico com a finalidade de se buscar melhores condições para os trabalhos do comitê

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 20/11/2022
- **Conclusão:** 07/12/2022

4.2. 2. Reunião de alinhamento com o CBH

Realizar reunião inicial de alinhamento com o Comitê de Bacia Hidrográfica e o técnico da AGERH responsável pelo CBH

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 06/07/2023
- **Conclusão:** 21/06/2023

4.3. 3. Requisitar ao CBH Plano de Trabalho

Requisitar para o CBH a apresentação do Plano de Trabalho a ser implementado no ano de 2023 baseado no Plano de Bacia e Manual Operativo

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 01/12/2023
- **Conclusão:** 30/10/2023

4.4. 4. Plano de Trabalho CBH Barra Seca e foz do rio Doce

Apresentação do Plano de Trabalho para ser implementado no ano de 2023

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 20/02/2024
- **Conclusão:**

5. PLANO DE BACIA DO RIO GUANDU

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

5.1. 1. Formulário Forms - Diagnóstico CBH

Enviar para o CBH, por meio de Ofício, um questionário (formulário Forms) para que o CBH preencha em reunião conjunta. Os questionamentos não caracterizam uma fiscalização, apenas um diagnóstico com a finalidade de se buscar melhores condições para os trabalhos do comitê

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 20/11/2022
- **Conclusão:** 07/12/2022

5.2. 2. Reunião de alinhamento com o CBH

Realizar reunião inicial de alinhamento com o Comitê de Bacia Hidrográfica e o técnico da AGERH responsável pelo CBH

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 06/07/2023
- **Conclusão:** 10/05/2023

5.3. 3. Requisitar ao CBH Plano de Trabalho

Requisitar para o CBH a apresentação do Plano de Trabalho a ser implementado no ano de 2023 baseado no Plano de Bacia e Manual Operativo

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 01/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

5.4. 4. Plano de Trabalho CBH Rio Guandu

Apresentação do Plano de Trabalho para ser implementado no ano de 2023

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 20/02/2024
- **Conclusão:**

6. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ALTO RIO NOVO

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

6.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 12/12/2022
- **Conclusão:** 28/02/2023

6.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 14/03/2023

6.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 27/07/2023

6.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 27/07/2023

7. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MARILÂNDIA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

7.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 28/02/2023

7.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 14/03/2023

7.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 25/04/2023
- **Conclusão:** 25/04/2023

7.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 25/04/2023

8. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PANCAS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

8.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 28/02/2023

8.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 14/03/2023

8.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 20/08/2023

8.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/08/2023

9. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RIO BANANAL

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

9.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula

- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 28/02/2023

9.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 14/03/2023

9.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/04/2023
- **Conclusão:** 03/03/2023

9.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

10. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO DOMINGOS DO NORTE

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

10.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022

- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 23/03/2023

10.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 23/03/2023

10.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 09/05/2023

10.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 03/05/2023

11. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ÁGUIA BRANCA

A situação dessa fase é "Fazendo". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

11.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 23/03/2023

11.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 23/03/2023

11.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

11.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

12. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO GABRIEL DA PALHA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

12.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 23/03/2023

12.2. 1. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 23/03/2023

12.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 05/12/2023

12.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 05/12/2023

13. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VILA VALÉRIO

A situação dessa fase é "Fazendo". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

13.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 23/03/2023

13.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 23/03/2023

13.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

13.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

14. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - GOVERNADOR LINDENBERG

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

14.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 28/02/2023

14.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula

- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 14/03/2023

14.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/04/2023
- **Conclusão:** 29/03/2023

14.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Marcos José Marsaioli
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/04/2023
- **Conclusão:** 03/08/2023

15. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ITAGUAÇU

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

15.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 28/02/2023

15.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022

- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 14/03/2023

15.3. 3. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/08/2023

15.4. 4. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/08/2023

16. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ITARANA

A situação dessa fase é "Fazendo". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

16.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 28/02/2023

16.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 14/03/2023

16.3. 3. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

16.4. 4.Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

17. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COLATINA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

17.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 28/02/2023

17.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 14/03/2023

17.3. 3. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Marcos José Marsaioli
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/04/2023
- **Conclusão:** 03/08/2023

17.4. 4. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/04/2023
- **Conclusão:** 29/03/2023

18. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO ROQUE DO CANAÃ

A situação dessa fase é "Fazendo". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

18.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 23/03/2023

18.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 05/05/2023

18.3. 3. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

18.4. 4. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

19. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - JAGUARÉ

A situação dessa fase é "Fazendo". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

19.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 23/03/2023

19.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 23/03/2023

19.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/04/2023
- **Conclusão:** 14/04/2023

19.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

20. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - LINHARES

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

20.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 28/02/2023

20.2. 1. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 14/03/2023

20.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula

- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 09/10/2023

20.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 09/10/2023

21. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SOORETAMA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

21.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 23/03/2023

21.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 23/03/2023

21.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022

- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 25/10/2023

21.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 25/10/2023

22. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BAIXO GUANDU

A situação dessa fase é "Fazendo". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

22.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 28/02/2023

22.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/02/2023
- **Conclusão:** 14/03/2023

22.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 08/11/2023

22.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

23. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BREJETUBA

A situação dessa fase é "Fazendo". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

23.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 23/03/2023

23.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 23/03/2023

23.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

23.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

24. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - LARANJA DA TERRA

A situação dessa fase é "Fazendo". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

24.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 28/02/2023

24.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 14/03/2023

24.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 19/09/2023

24.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Fazendo
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

25. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - AFONSO CLÁUDIO

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

25.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

ATIVIDADES (como fazer) Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 13/12/2022
- **Conclusão:** 28/02/2023

25.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 28/02/2023
- **Conclusão:** 14/03/2023

25.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 30/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 12/11/2023

25.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Bruna Legora de Paula
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022

- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 22/11/2023

::: Indicadores

Não possui indicadores cadastrados.

Ministério Público do Espírito Santo

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

COORDENADORIA REGIONAL III - BACIA HIDROGRÁFICA RIACHO E DOS REIS MAGOS

Tipo: Projeto
Status: Finalizado
Tags:

Área Regional:
Unidade:

::: Objetivo

Atuar em colaboração junto aos entes da política da bacia (à nível estadual, municipal e com os respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH) na troca de informações, no planejamento e no acompanhamento das obras / serviços executados afim de: • assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos; • a utilização racional e integrada dos recursos hídricos; • a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. METAS Faz parte das metas deste Plano de Atuação o atingimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 06, 12, 14 e 13 para 2030 de acordo com o pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015, pelos 193 países membros. ODS 6 – Água potável e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. ODS 12 – Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. ODS 14 – Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.

::: Equipe de Trabalho

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
CELINA RAQUEL VICENTE DE SOUZA
Convidado
(27) 3333-3333

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
LEILA LEÃO LACERDA
Convidado
(27) 3194-5000



Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
MARCOS JOSÉ MARSAIOLI
Gerente do Projeto
(27) 3194-5000

Promotoria de Justiça de Aracruz
RODRIGO KOELER GURTLER
Responsável pelo projeto
(27) 3333-3333

::: Plano de Ações

1. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FUNDÃO

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

1.1. 1. SEI aos aos Promotores de Justiça Naturais, com a atribuição em Meio Ambiente

Solicitar, por meio do SEI da Coordenadoria, aos Promotores de Justiça Naturais, com a atribuição em Meio Ambiente, que informe se possui Procedimento Administrativo de acompanhamento na promotoria referente a Esgotamento Sanitário do Município (Estações de Tratamento de Efluentes - ETE)

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 20/10/2023
- **Conclusão:** 18/09/2023

1.2. 2. Instauração de PA

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município, caso não o tenha.

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:**

1.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

1.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - IBIRAÇU

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

2.1. 1.SEI aos aos Promotores de Justiça Naturais, com a atribuição em Meio Ambiente

Solicitar, por meio do SEI da Coordenadoria, aos Promotores de Justiça Naturais, com a atribuição em Meio Ambiente, que informe se possui Procedimento Administrativo de acompanhamento na promotoria referente a Esgotamento Sanitário do Município (Estações de Tratamento de Efluentes - ETE)

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 20/10/2023
- **Conclusão:** 18/09/2023

2.2. 2. Instauração de PA

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município, caso não o tenha

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:** 26/09/2023

2.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

2.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

3. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - JOÂO NEIVA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

3.1. 1. SEI aos aos Promotores de Justiça Naturais, com a atribuição em Meio Ambiente

Solicitar, por meio do SEI da Coordenadoria, aos Promotores de Justiça Naturais, com a atribuição em Meio Ambiente, que informe se possui Procedimento Administrativo de acompanhamento na promotoria referente a Esgotamento Sanitário do Município (Estações de Tratamento de Efluentes - ETE)

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 20/10/2023
- **Conclusão:** 18/09/2023

3.2. 2. Instauração de PA

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município, caso não o tenha.

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:** 26/09/2023

3.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

3.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/09/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

4. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SANTA TERESA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

4.1. 1. SEI aos aos Promotores de Justiça Naturais, com a atribuição em Meio Ambiente

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 20/10/2023
- **Conclusão:** 18/09/2023

4.2. 2. Instauração de PA

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município, caso não o tenha.

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

4.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

4.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

5. PLANO DE BACIA - RIACHO E REIS MAGOS

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

5.1. 1. Formulário Forms - Diagnóstico CBH

Enviar para o CBH, por meio de Ofício, um questionário (formulário Forms) para que o CBH preencha em reunião conjunta. Os questionamentos não caracterizam uma fiscalização, apenas um diagnóstico com a finalidade de se buscar melhores condições para os trabalhos do comitê

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 19/09/2023

5.2. 2. Reunião de alinhamento com o CBH

Realizar reunião inicial de alinhamento com o Comitê de Bacia Hidrográfica e o técnico da AGERH responsável pelo CBH

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

5.3. 3. Requisitar ao CBH Plano de Trabalho

Requisitar para o CBH a apresentação do Plano de Trabalho a ser implementado no ano de 2023 baseado no Plano de Bacia e Manual Operativo

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

6. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ARACRUZ

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

6.1. 1. SEI aos aos Promotores de Justiça Naturais, com a atribuição em Meio Ambiente

Solicitar, por meio do SEI da Coordenadoria, aos Promotores de Justiça Naturais, com a atribuição em Meio Ambiente, que informe se possui Procedimento Administrativo de acompanhamento na promotoria referente a Esgotamento Sanitário do Município (Estações de Tratamento de Efluentes - ETE)

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:** 18/09/2023

6.2. 2. Instauração de PA

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município, caso não o tenha.

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/11/2023
- **Conclusão:** 28/11/2023

6.3. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

6.4. 3. Requisitar ao CBH Plano de Trabalho

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente. Obs.; onde não houver ETEs verificar se há previsão de construção.

- **Responsável:** Rodrigo Koeler Gurtler
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

::: Indicadores

Não possui indicadores cadastrados.

Ministério Público do Espírito Santo

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

COORDENADORIA REGIONAL IV (REGIÃO I) - BACIA HIDROGRÁFICA RIO JUCU

Tipo: Projeto
Status: Finalizado
Tags:

Área Regional:
Unidade:

::: Objetivo

Atuar em colaboração junto aos entes da política da bacia (à nível estadual, municipal e com os respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH) na troca de informações, no planejamento e no acompanhamento das obras / serviços executados afim de: • assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos; • a utilização racional e integrada dos recursos hídricos; • a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. METAS Faz parte das metas deste Plano de Atuação o atingimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 06, 12, 14 e 13 para 2030 de acordo com o pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015, pelos 193 países membros. ODS 6 – Água potável e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. ODS 12 – Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. ODS 14 – Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.

::: Equipe de Trabalho

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
DAYANA DOS SANTOS GONÇALVES
Convidado
(27) 3333-3333

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
LEILA LEÃO LACERDA
Convidado
(27) 3194-5000



Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
MARCOS JOSÉ MARSAIOLI
Gerente do Projeto
(27) 3194-5000

Promotoria de Justiça Cível de Serra
RONALDO GONÇALVES DE ASSIS
Responsável pelo projeto
(27) 3333-3333

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
YAN DOS SANTOS LUCAS
Convidado
(27) 3333-3333

::: Plano de Ações

1. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CARIACICA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

1.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 24/11/2023

1.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

1.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

1.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023

- **Conclusão:**

2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SERRA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

2.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/03/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

2.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/03/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

2.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 30/08/2023

2.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 06/12/2023

3. PLANO DE BACIA RIO JUCU

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

3.1. 1. Formulário Forms

SEnviar para o CBH, por meio de Ofício, um questionário (formulário Forms) para que o CBH preencha em reunião conjunta. Os questionamentos não caracterizam uma fiscalização, apenas um diagnóstico com a finalidade de se buscar melhores condições para os trabalhos do comitê

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/01/2023
- **Conclusão:** 12/05/2023

3.2. 2. Reunião Alinhamento CBH Jucu

Realizar reunião inicial de alinhamento com o Comitê de Bacia Hidrográfica e o técnico da AGERH responsável pelo CBH

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/03/2023
- **Conclusão:** 27/07/2023

3.3. 3. Requisitar ao CBH Jucu um Plano de Trabalho

Requisitar para o CBH a apresentação do Plano de Trabalho a ser implementado no ano de 2023 baseado no Plano de Bacia e Manual Operativo

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/03/2023
- **Conclusão:** 16/05/2023

3.4. 4. Plano de Trabalho CBH Rio Jucu

Apresentação do Plano de Trabalho para ser implementado no ano de 2023 ser apresentado dia 07/12/2023

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 15/12/2023

4. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DOMINGOS MARTINS

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

4.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 24/11/2023

4.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 24/11/2023

4.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 24/12/2023

4.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 24/12/2023

5. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VIANA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

5.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 24/11/2024

5.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 24/11/2023

5.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 24/12/2023

5.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 24/11/2023

6. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MARECHAL FLORIANO

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

6.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

6.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

6.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

6.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Ronaldo Gonçalves de Assis
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 10/01/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

::: Indicadores

Não possui indicadores cadastrados.

Ministério Público do Espírito Santo

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

COORDENADORIA REGIONAL V (REGIÃO II) BACIA HIDROGRÁFICA RIO SANTA MARIA DA VITÓRIA

Tipo: Projeto
Status: Finalizado
Tags:

Área Regional:
Unidade:

::: Objetivo

Atuar em colaboração junto aos entes da política da bacia (à nível estadual, municipal e com os respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH) na troca de informações, no planejamento e no acompanhamento das obras / serviços executados afim de: • assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos; • a utilização racional e integrada dos recursos hídricos; • a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. METAS Faz parte das metas deste Plano de Atuação o atingimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 06, 12, 14 e 13 para 2030 de acordo com o pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015, pelos 193 países membros. ODS 6 – Água potável e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. ODS 12 – Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. ODS 14 – Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.

::: Equipe de Trabalho

Promotoria de Justiça de Santa Leopoldina
JEFFERSON VALENTE MUNIZ
Responsável pelo projeto
(27) 3333-3333

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
LEILA LEÃO LACERDA
Convidado
(27) 3194-5000

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
MARCOS JOSÉ MARSAIOLI
Gerente do Projeto
(27) 3194-5000

Coordenadoria Regional V (R2) - Bacia Hidrográfica do Rio Jucu e Santa Maria da Vitória
RAPHAEL PUCCINI DE SOUZA
Convidado
(27) 3266-1105

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
YAN DOS SANTOS LUCAS
Convidado
(27) 3333-3333

::: Plano de Ações

1. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SANTA LEOPOLDINA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

1.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/03/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

1.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/03/2023
- **Conclusão:** 30/03/2023

1.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

1.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

2. PLANO DE BACIA DO RIO STA MARIA DA VITÓRIA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

2.1. 1. Formulário Forms - Diagnóstico CBH

Enviar para o CBH, por meio de Ofício, um questionário (formulário Forms) para que o CBH preencha em reunião conjunta. Os questionamentos não caracterizam uma fiscalização, apenas um diagnóstico com a finalidade de se buscar melhores condições para os trabalhos do comitê

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 15/11/2022
- **Conclusão:** 15/12/2022

2.2. 2. Reunião de alinhamento com o CBH

Realizar reunião inicial de alinhamento com o Comitê de Bacia Hidrográfica e o técnico da AGERH responsável pelo CBH

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/03/2023
- **Conclusão:** 30/06/2023

2.3. 3. Requisitar ao CBH Plano de Trabalho

Requisitar para o CBH a apresentação do Plano de Trabalho a ser implementado no ano de 2023 baseado no Plano de Bacia e Manual Operativo

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

2.4. 4. Plano de trabalho CBH

Apresentação do Plano de Trabalho para ser implementado no ano de 2023

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

3. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VITÓRIA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

3.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 14/08/2023

3.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 14/08/2023

3.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

3.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

4. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VILA VELHA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

4.1. 1. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:** 04/10/2023

4.2. 2. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:** 04/10/2023

4.3. 3. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

4.4. 4. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

5. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SANTA MARIA DE JETIBÁ

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

5.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 17/08/2023

5.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 17/08/2023

5.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

5.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município.

- **Responsável:** Jefferson Valente Muniz
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

::: Indicadores

Não possui indicadores cadastrados.

Ministério Público do Espírito Santo

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

COORDENADORIA REGIONAL VI - BACIA HIDROGRÁFICA GUARAPARI, BENEVENTE E RIO NOVO

Tipo: Projeto
Status: Finalizado
Tags:

Área Regional:
Unidade:

::: Objetivo

Atuar em colaboração junto aos entes da política da bacia (à nível estadual, municipal e com os respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH) na troca de informações, no planejamento e no acompanhamento das obras / serviços executados afim de: • assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos; • a utilização racional e integrada dos recursos hídricos; • a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. METAS Faz parte das metas deste Plano de Atuação o atingimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 06, 12, 14 e 13 para 2030 de acordo com o pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015, pelos 193 países membros. ODS 6 – Água potável e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. ODS 12 – Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. ODS 14 – Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.

::: Equipe de Trabalho

Promotoria de Justiça de Vargem Alta
DANIEL DE ANDRADE NOVAES
Responsável pelo projeto
(27) 3333-3333

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
LEILA LEÃO LACERDA
Convidado
(27) 3194-5000



Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
MARCOS JOSÉ MARSAIOLI
Gerente do Projeto
(27) 3194-5000

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
YAN DOS SANTOS LUCAS
Convidado
(27) 3333-3333

::: Plano de Ações

1. PLANO DE BACIA DO RIO BENEVENTE E GUARAPARI

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

1.1. 1. Formulário Forms - Diagnóstico CBH

Enviar para o CBH, por meio de Ofício, um questionário (formulário Forms) para que o CBH preencha em reunião conjunta. Os questionamentos não caracterizam uma fiscalização, apenas um diagnóstico com a finalidade de se buscar melhores condições para os trabalhos do comitê

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 15/11/2022
- **Conclusão:** 07/12/2022

1.2. 2. Reunião de alinhamento com o CBH

Realizar reunião inicial de alinhamento com o Comitê de Bacia Hidrográfica e o técnico da AGERH responsável pelo CBH

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 20/02/2023
- **Conclusão:** 01/02/2023

1.3. 3. Requisitar ao CBH Plano de Trabalho

Requisitar para o CBH a apresentação do Plano de Trabalho a ser implementado no ano de 2023 baseado no Plano de Bacia e Manual Operativo

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 25/02/2023
- **Conclusão:** 14/02/2023

1.4. 4. Plano de Trabalho

Apresentação do Plano de Trabalho para ser implementado no ano de 2023

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ALFREDO CHAVES

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

2.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 20/08/2023
- **Conclusão:** 30/07/2023

2.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

2.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

2.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

3. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ANCHIETA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

3.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 20/08/2023
- **Conclusão:** 30/07/2023

3.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

3.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

3.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

4. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PIÚMA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

4.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes

- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 20/08/2023
- **Conclusão:** 30/07/2023

4.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

4.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

4.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

5. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - GUARAPARI

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

5.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022

- **Prev Fim:** 20/08/2023
- **Conclusão:** 30/07/2023

5.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

5.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

5.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

6. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - RIO NOVO DO SUL

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

6.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 20/08/2023
- **Conclusão:** 30/07/2023

6.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

6.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

6.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

7. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ICONHA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

7.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 20/08/2023
- **Conclusão:** 30/07/2023

7.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

7.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

7.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

8. ESGOTAMENTO SANITÁRIO - VARGEM ALTA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

8.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 20/08/2023
- **Conclusão:** 30/07/2023

8.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

8.3. 3. Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Concessionária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise da existência de documentação (licenciamento e outorga) e eficiência das ETEs do Município, bem como discussão sobre as ações necessárias para adequá-las à Resolução CONAMA 430/2011 e condicionantes do licenciamento ambiental, quando existente.

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

8.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

9. PLANO DE BACIA DO RIO NOVO

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

9.1. 1. Formulário Forms - Diagnóstico CBH

Enviar para o CBH, por meio de Ofício, um questionário (formulário Forms) para que o CBH preencha em reunião conjunta. Os questionamentos não caracterizam uma fiscalização, apenas um diagnóstico com a finalidade de se buscar melhores condições para os trabalhos do comitê

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 15/11/2022
- **Conclusão:** 07/12/2022

9.2. 2. Reunião de alinhamento com o CBH

Realizar reunião inicial de alinhamento com o Comitê de Bacia Hidrográfica e o técnico da AGERH responsável pelo CBH

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 20/02/2023
- **Conclusão:** 01/02/2023

9.3. 3. Requisitar ao CBH Plano de Trabalho

Requisitar para o CBH a apresentação do Plano de Trabalho a ser implementado no ano de 2023 baseado no Plano de Bacia e Manual Operativo

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 25/02/2023
- **Conclusão:** 14/03/2023

9.4. 4. Plano de Trabalho

Apresentação do Plano de Trabalho para ser implementado no ano de 2023

- **Responsável:** Daniel de Andrade Novaes
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2022
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

::: Indicadores

Não possui indicadores cadastrados.

Ministério Público do Espírito Santo

INOVA | Sistema de Gestão de Projetos e Processos

COORDENADORIA REGIONAL VII - BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS ITAPEMIRIM E ITABAPOANA

Tipo: Projeto
Status: Finalizado
Tags:

Área Regional:
Unidade:

::: Objetivo

Atuar em colaboração junto aos entes da política da bacia (à nível estadual, municipal e com os respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBH) na troca de informações, no planejamento e no acompanhamento das obras / serviços executados afim de: • assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos; • a utilização racional e integrada dos recursos hídricos; • a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. METAS Faz parte das metas deste Plano de Atuação o atingimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 06, 12, 14 e 13 para 2030 de acordo com o pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015, pelos 193 países membros. ODS 6 – Água potável e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. ODS 12 – Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. ODS 14 – Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.

::: Equipe de Trabalho

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
LEILA LEÃO LACERDA
Convidado
(27) 3194-5000



Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
MARCOS JOSÉ MARSAIOLI
Gerente do Projeto
(27) 3194-5000

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagistico e Urbaníst
MÔNICA CAROLINE GOMES CARNEIRO
Convidado
(27) 3333-3333

Promotoria de Justiça Cível de Cachoeiro de Itapemirim
WAGNER EDUARDO VASCONCELLOS
Responsável pelo projeto
(27) 3333-3333

::: Plano de Ações

1. PLANO DE BACIA DO RIO ITAPEMIRIM

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

1.1. 1. Formulário Forms - Diagnóstico CBH

Enviar para o CBH, por meio de Ofício, um questionário (formulário Forms) para que o CBH preencha em reunião conjunta. Os questionamentos não caracterizam uma fiscalização, apenas um diagnóstico com a finalidade de se buscar melhores condições para os trabalhos do comitê

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:**

1.2. 2. Reunião de alinhamento com o CBH

Realizar reunião inicial de alinhamento com o Comitê de Bacia Hidrográfica e o técnico da AGERH responsável pelo CBH

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:**

1.3. 3. Requisitar ao CBH Plano de Trabalho

Requisitar para o CBH a apresentação do Plano de Trabalho a ser implementado no ano de 2023 baseado no Plano de Bacia e Manual Operativo

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:**

1.4. 4. Plano de Trabalho

Apresentação do Plano de Trabalho para ser implementado no ano de 2023

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:**

2. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

2.1. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 02/08/2023

2.2. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do do Plano Municipal de Saneamento Básico.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 02/09/2023

2.3. 3. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 02/08/2023

2.4. 4. Acompanhamento da Implantação

Acompanhar a implementação do do Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 02/08/2023

3. PLANO DE BACIA DO RIO ITABAPOANA

A situação dessa fase é "Feito". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

3.1. 1. Reunião de alinhamento com o CBH

Realizar reunião inicial de alinhamento com o Comitê de Bacia Hidrográfica e o técnico da AGERH responsável pelo CBH

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023

- **Prev Fim:** 30/11/2023
- **Conclusão:** 28/09/2023

3.2. 3. Formulário Forms - Diagnóstico CBH

Enviar para o CBH, por meio de Ofício, um questionário (formulário Forms) para que o CBH preencha em reunião conjunta. Os questionamentos não caracterizam uma fiscalização, apenas um diagnóstico com a finalidade de se buscar melhores condições para os trabalhos do comitê

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/10/2023

4. CASTELO

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

4.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do do Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:** 20/11/2023

4.2. 3. Informar ao Coordenador

Acompanhar a implementação do do Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

4.3. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

4.4. 4. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

5. CONCEIÇÃO DO CASTELO

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

5.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:** 10/12/2023

5.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

5.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

5.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023

- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

6. IBITIRAMA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

6.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:** 22/10/2023

6.2. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

6.3. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

6.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

7. IRUPI

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

7.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

7.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

7.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

7.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

8. JERÔNIMO MONTEIRO

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

8.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos

- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:** 22/10/2023

8.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

8.3. 3. Reunião junto a Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

8.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

9. MUNIZ FREIRE

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

9.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 10/10/2023

9.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

9.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

9.4. 3. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

10. VENDA NOVA DO IMIGRANTE

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

10.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 10/09/2023

10.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023

- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

10.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 20/12/2023

10.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

11. IBATIBA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

11.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:** 11/11/2023

11.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

11.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento

Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

11.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

12. IUNA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

12.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:** 15/11/2023

12.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

12.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023

- **Conclusão:**

12.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

13. MARATAÍZES

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

13.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:** 15/11/2023

13.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

13.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

13.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

14. DIVINO SÃO LOURENÇO

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

14.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 20/09/2023

14.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

14.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

14.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

15. MUQUI

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

15.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:** 11/11/2023

15.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

15.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

15.4. 4. Informar ao Coordenador o

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

16. ALEGRE

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

16.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 10/09/2023

16.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

16.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

16.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

17. ITAPEMIRIM

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

17.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/10/2023

- **Conclusão:** 05/11/2023

17.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

17.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

17.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

18. ATÍLIO VIVACQUA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

18.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 01/10/2023

18.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

18.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

18.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

19. GUAÇUI

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

19.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:** 11/11/2023

19.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

19.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

19.4. 4. Plano de Trabalho

Requisitar do poder público municipal um Plano de Trabalho com cronograma das ações a serem executadas para adequação das ETEs existentes (em termos de documentação e eficiência de tratamento) e/ou para construção de novas ETEs no município

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/03/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

20. SÃO JOSÉ DO CALÇADO

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

20.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 10/10/2023

20.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

20.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento

Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

20.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

21. BOM JESUS DO NORTE

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

21.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/10/2023
- **Conclusão:** 04/11/2023

21.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

21.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023

- **Conclusão:**

21.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

22. APIACA

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

22.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/06/2023
- **Conclusão:** 08/09/2023

22.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

22.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

22.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

23. MIMISO DO SUL

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

23.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 10/10/2023

23.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

23.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

23.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

24. DORES DO RIO PRETO

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

24.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/08/2023
- **Conclusão:** 02/09/2023

24.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

24.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 10/12/2023

24.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

25. PRESIDENT KENNEDY

A situação dessa fase é "A Fazer". A seguir estão relacionadas as atividades desta fase.

25.1. 2. Instauração de Procedimento Administrativo

Propor instauração de PA para acompanhar a situação do esgotamento sanitário no município.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/09/2023
- **Conclusão:** 10/10/2023

25.2. 1. Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica

Reunião junto ao Promotores de Justiça Naturais da bacia hidrográfica para alinhamento das estratégias a serem adotadas para a realização das atividades abaixo elencadas

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** Feito
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:** 30/11/2023

25.3. 3. Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Reunião junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e do cronograma de implementação.

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

25.4. 4. Informar ao Coordenador

Informar ao Coordenador a atual situação que se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico

- **Responsável:** Wagner Eduardo Vasconcellos
- **Situação:** A Fazer
- **Prev Início:** 01/08/2023
- **Prev Fim:** 30/12/2023
- **Conclusão:**

::: Indicadores

Não possui indicadores cadastrados.
